


# Chapitre 2

La conduite du projet

# Le cycle de vie d'un projet

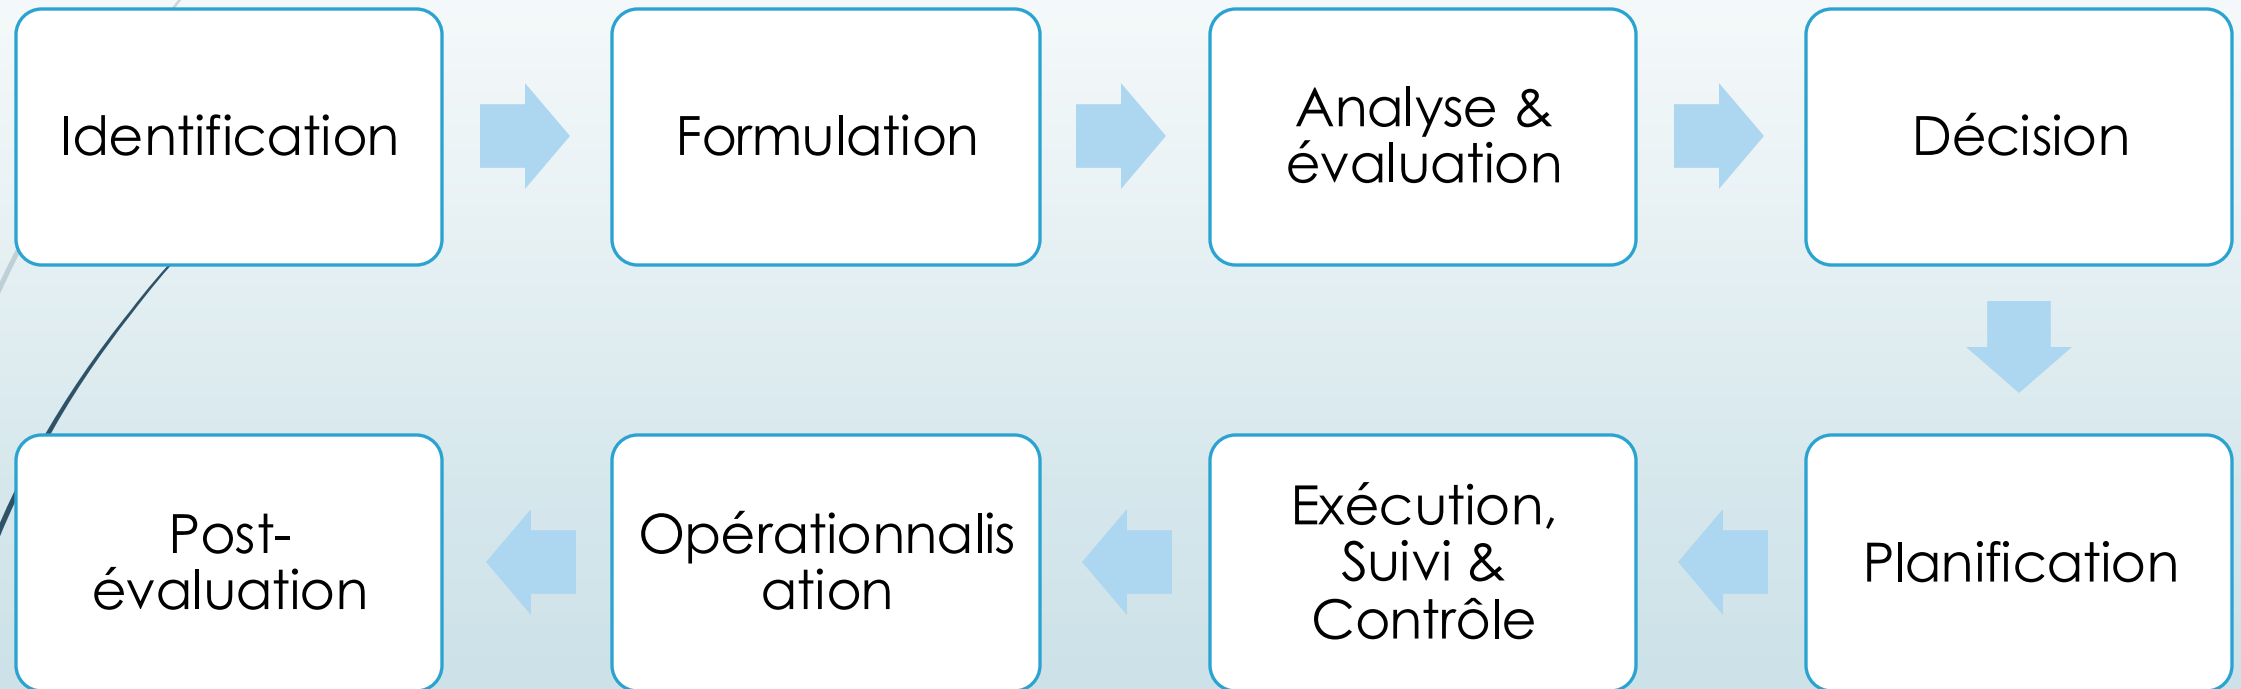

# Les phases du projet

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Identification</b>                    | • Trouver une idée                       |
| <b>Formulation</b>                       | • Bien définir pour mieux saisir         |
| <b>Analyse &amp; évaluation :</b>        | • Faisabilité et profitabilité           |
| <b>Décision</b>                          | • Go, no go, tiroir à projets ?          |
| <b>Planification</b>                     | • Organisation                           |
| <b>Exécution, suivi &amp; contrôle :</b> | • Budget, échéancier, qualité et risques |
| <b>Opérationnalisation</b>               | • Déploiement et/ou livraison            |
| <b>Post-évaluation</b>                   | • post-mortem                            |

MODE DE  
GESTION

Projet

Opérations

PÉRIODES

ÉTUDE

MISE EN OEUVRE

OPÉRATIONNALISATION

PHASES

Faisabilité

Décision & Planification

Réalisation

Suivi & contrôle

Évaluation

ÉVÉNEMENTS

Sélection &  
définition



Déploiement

Clôture

Niveau d'activité

Niveau typique  
d'intensité d'un  
cycle de projet

Temps

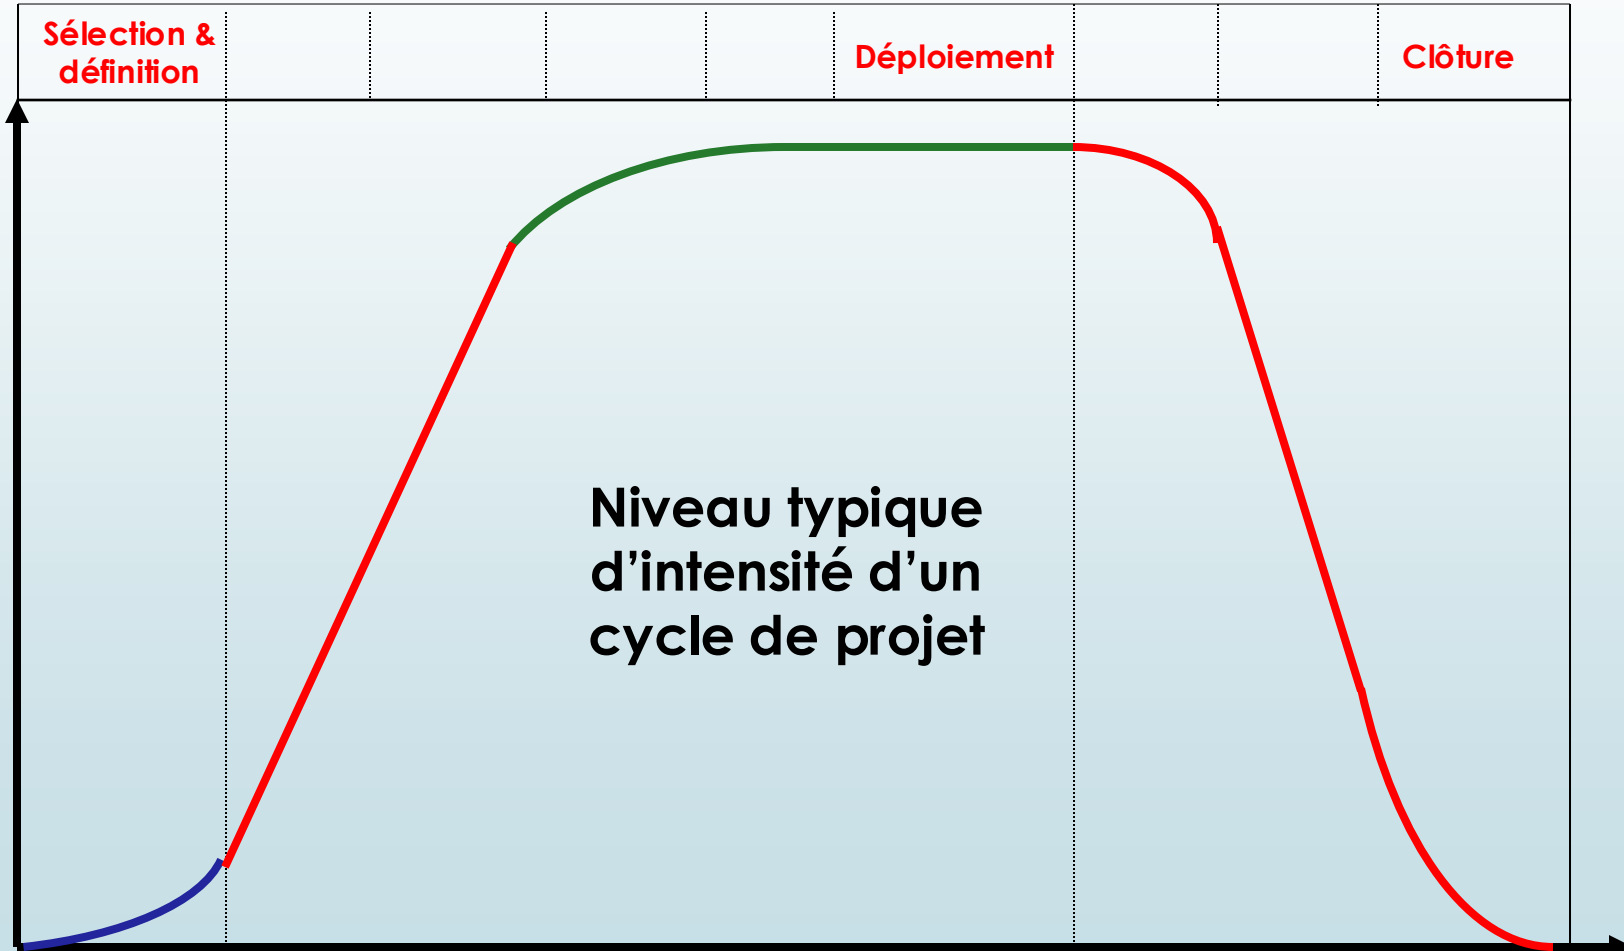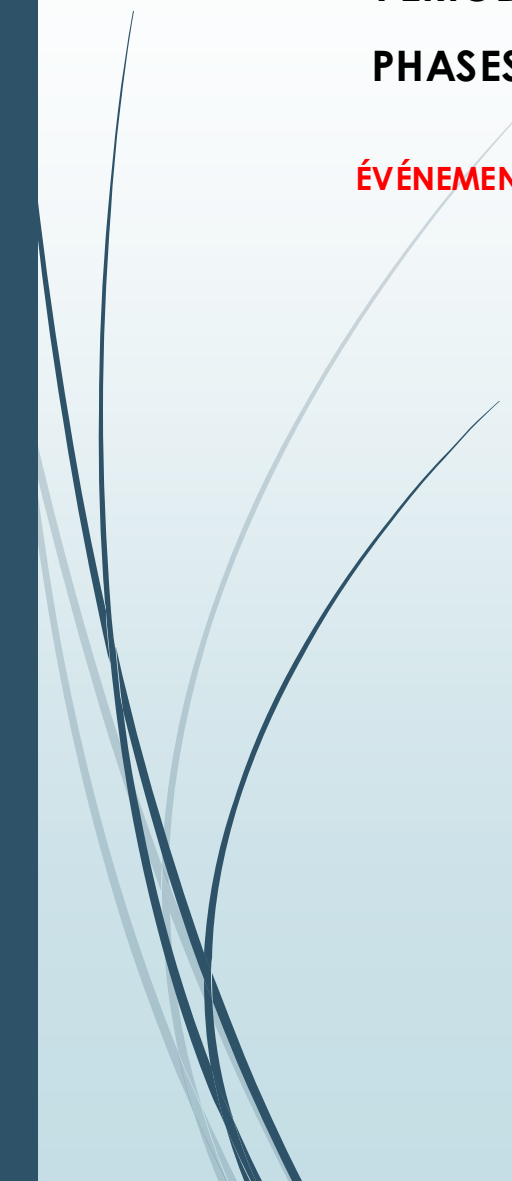

# 1. L'identification et la formulation

Des idées de projets à l'idée du projet : l'identification  
Le concept du projet : la formulation

# 1. Identification et formulation

1. Générer des idées

2. Filtrer les idées

# Techniques de génération de nouvelles idées

Analyse  
fonctionnelle

Analyse par  
les attributs

Brainstorming

Technique  
des groupes  
nominaux

# Analyse fonctionnelle

## Le principe

cette technique consiste à établir une **liste de fonctionnalités** qui sert à améliorer les produits et/ou les services à partir de recommandations ou de **propositions des clients**.

## La méthode

demander aux clients de dresser une liste précisant la nature de leurs **insatisfactions** et les **problèmes** qu'ils rencontrent lors de **l'utilisation** d'un des produits et/ou services de l'entreprise ou de la concurrence.

## La procédure

1. Mandater un expert externe et/ou des spécialistes internes
2. Dresser une liste exhaustive des services et produits existants
3. Élaborer un questionnaire semi-ouvert de satisfaction
4. Constituer un panel (représentatif) de répondants (clientèle)
5. Filtrer les idées émergentes



# Analyse par attributs

## Le principe

cette technique consiste à **combiner** des **attributs** d'un produit ou d'un service fournis par une organisation.

## La méthode

On caractérise un produit ou un service par leurs **attributs physiques et perceptuels** puis on procède par une combinaison de ces attributs jusqu'à **l'obtention d'une combinaison** originale, améliorée ou offrant un **niveau de satisfaction supérieur** à ce qui est proposée.

## La procédure

1. Mandater des experts et des spécialistes (internes et externes)
2. Questionner : A quoi sert notre produit ? Peut-on élargir son utilisation à d'autres fins ? Peut-on spécifier son usage ? Peut-on modifier sa composition ?
3. Filtrer les idées

# Le Brainstorming

## Le principe

Il s'agit d'une technique d'exploration d'idées de projet sous environnement contrôlé

## La méthode

Soumettre un problème précis à une discussion ouverte. Les évaluations hâtives ne sont pas permises et les idées extravagantes sont à analyser avec une attention particulière

## La procédure

1. Formuler le problème à solutionner
2. Réunir, durant une heure matinale, un groupe restreint d'individus autour du dit problème
3. Enregistrer toutes les suggestions
4. Filtrer les idées

# Techniques des groupes nominaux

## Le principe et la méthode

Trouver des idées et permettre à un groupe de se mettre d'accord en élaborant une liste de problèmes, questions ou actions classés par ordre de priorité.

Une variante de cette méthode est d'encourager les participants à proposer des solutions possibles à un problème donné.

## Procédure:

- 1. Établissez une liste des problèmes, questions ou actions qui doivent être hiérarchisés.
- 2. Chaque participant classe, de manière indépendante, les divers énoncés sur une série de cartes en fonction de ses priorités.
- 3. Les cartes sur lesquelles figurent les classements sont ensuite ramassées et le pointage est fait sur la feuille de référence.
- 4. Le score total obtenu pour chaque énoncé permettra d'effectuer le classement par ordre d'importance.

## Exercice

- En utilisant la technique des groupes nominaux, déterminez et classez les 5 principaux problèmes rencontrés par les nouveaux bacheliers à l'entrée à l'école des hautes études commerciales.

# Les phases du projet

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Identification</b>                    | • Trouver une idée                       |
| <b>Formulation</b>                       | • Bien définir pour mieux saisir         |
| <b>Analyse &amp; évaluation :</b>        | • Faisabilité et profitabilité           |
| <b>Décision</b>                          | • Go, no go, tiroir à projets ?          |
| <b>Planification</b>                     | • Organisation                           |
| <b>Exécution, suivi &amp; contrôle :</b> | • Budget, échéancier, qualité et risques |
| <b>Opérationnalisation</b>               | • Déploiement et/ou livraison            |
| <b>Post-évaluation</b>                   | • post-mortem                            |

# 1. Identification et formulation

1. Générer des idées

**2. Filtrer les idées**

## 2. Techniques de filtrage des idées

### Méthodes de pré-sélection:

**l'élimination des idées projet jugées non pertinentes par l'organisation**

### Méthodes de priorisation:

**les idées de projet retenues ne bénéficient pas de la même importance**

Méthode managériale  
Méthode stratégique

Méthodes analytiques  
Méthodes intuitives

# Techniques de Présélection

## Méthode managériale

### • SMART

Oui Non

- Spécificités connues
- Input et output Mesurables
- Objectifs Atteignables et but Réalisable
- Processus limité dans le Temps, ayant un début et une fin prévisibles

## Méthode stratégique

### • SAFE

Oui Non

- Souhaitable par les dirigeants
- Acceptable du point de vue normes, législation, brevets, opinion public
- Faisable : habilités techniques, expertises, capacités financières
- Entrepreneurial : génère de la valeur



# Techniques de priorisation

17

## Méthodes analytiques

- **Sans pointage**
- **Pointage non pondéré**
- **Pointage pondéré**

## Méthodes intuitives

- basées sur des considérations politiques, entrepreneuriales, contextuelles
- **Préférence légitime** : “It's that I want and nothing else”
- **Opportunité plausible** : “The right thing at the right moment”
- **Situation d'urgence** : “It is now or never”
- **La pression concurrentielle** : “We've to catch up them”

## Exercice

- Choisissez le projet que vous voulez entreprendre, en utilisant une des deux techniques

## 2. Analyse et évaluation

Les études de faisabilité permettent aux décideurs

- D'analyser en profondeur les composantes du projet
- D'identifier et d'analyser les risques liés au projet
- D'identifier et de pré-évaluer les impacts du projet
- D'arrêter la décision quant à la réalisation ou non du projet

## ■ Les analyses primaires : Peut-on le faire ?

- ✓ Analyses technologiques et techniques : pour un devis technique
- ✓ Analyse marketing : besoins, standards de qualité, quantités, prix, livraison,...
- ✓ Analyse organisationnelle : ressources et structures du projet

## ■ Les analyses dérivées : est ce justifiable ?

- ✓ Analyses financières : financement, revenus, retour sur investissement...
- ✓ Analyses économiques, environnementales, socioculturelles et politiques

# L'étude de faisabilité

- L'étude de faisabilité est un document descriptif abordant les aspects techniques, qualité, financiers et calendaires d'un projet. Il doit permettre à toutes les personnes concernées d'appréhender les objectifs et les enjeux du projet et de statuer sur sa validation finale.
- Un dossier de faisabilité doit être établi, quelle que soit la nature d'un projet : développement d'un nouveau produit, service ou prestation, nouveau projet technique de construction, etc.

## Etape 1 : Analyse des besoins

- Par exemple, le cas le plus « simple » est la création d'une entreprise. Il faut un local, éventuellement du personnel, par conséquent du mobilier, du matériel de bureau, etc.
- Une fois les besoins listés, vous pourrez faire une estimation grossière de l'investissement nécessaire à la réalisation du projet. Cela vous permettra de voir assez rapidement sa faisabilité.

# Etape 1 : Analyse des besoins

- Les besoins d'ordre immobilier (local, entretien, ...),
- Les besoins mobiliers (bureaux, matériel de bureau, ordinateurs, ...),
- Les besoins de compétence (personnel, formation, sous-traitance, ...)
- Les besoins de production (matériaux, matières premières, marchandises,...)
- Les besoins de commercialisation (communication, commercialisation, ...)
- Les besoins techniques (innovation, prestation, comptabilité, juridique, social, fiscalité, ...),
- etc.

## Etape 2: Établissez des scénarios

- D'abord établir une matrice SWOT (pour Strength, Weakness, Opportunities and Threats). Il s'agit d'un tableau à 4 cases réparties en deux colonnes dans lesquelles vous inscrivez les éléments correspondants :
- Les forces de votre projet
- Ses faiblesses
- Les opportunités en terme de marché
- Les menaces en terme de marché (elles peuvent concerner la concurrence, la législation, des évolutions technologiques, etc.)
- À partir de cette matrice vous pouvez établir des stratégies de communication, de commercialisation, etc. et les mettre à l'épreuve de différentes possibilités.



# Exercice

- Faites l'analyse SWOT du projet collectif choisi

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Forces</b>       | <b>Faiblesses</b> |
|                     |                   |
| <b>Opportunités</b> | <b>Menaces</b>    |
|                     |                   |


## Etape 2: Établissez des scénarios

- Veillez à établir au moins 3 scénarios : un optimiste, un neutre et un pessimiste.
- Idéalement, votre projet doit tenir la route même dans le scénario pessimiste. Si ce n'est pas le cas, reprenez depuis le départ.

## Etape 3 : Sélectionnez le scénario

- Il faudra bien se fixer à un moment. Et même si, bien évidemment, vous ne pouvez prédire l'avenir et qu'il y a fort à parier que vos scénarios ne tiendront pas 3 mois face à la réalité, il va bien falloir en choisir un comme fondement de votre stratégie de mise en place de votre projet.
- Mais gardez les autres scénarios en tête : ils pourront vous servir à ajuster votre stratégie au fil du temps.

# Le cycle de vie d'un projet

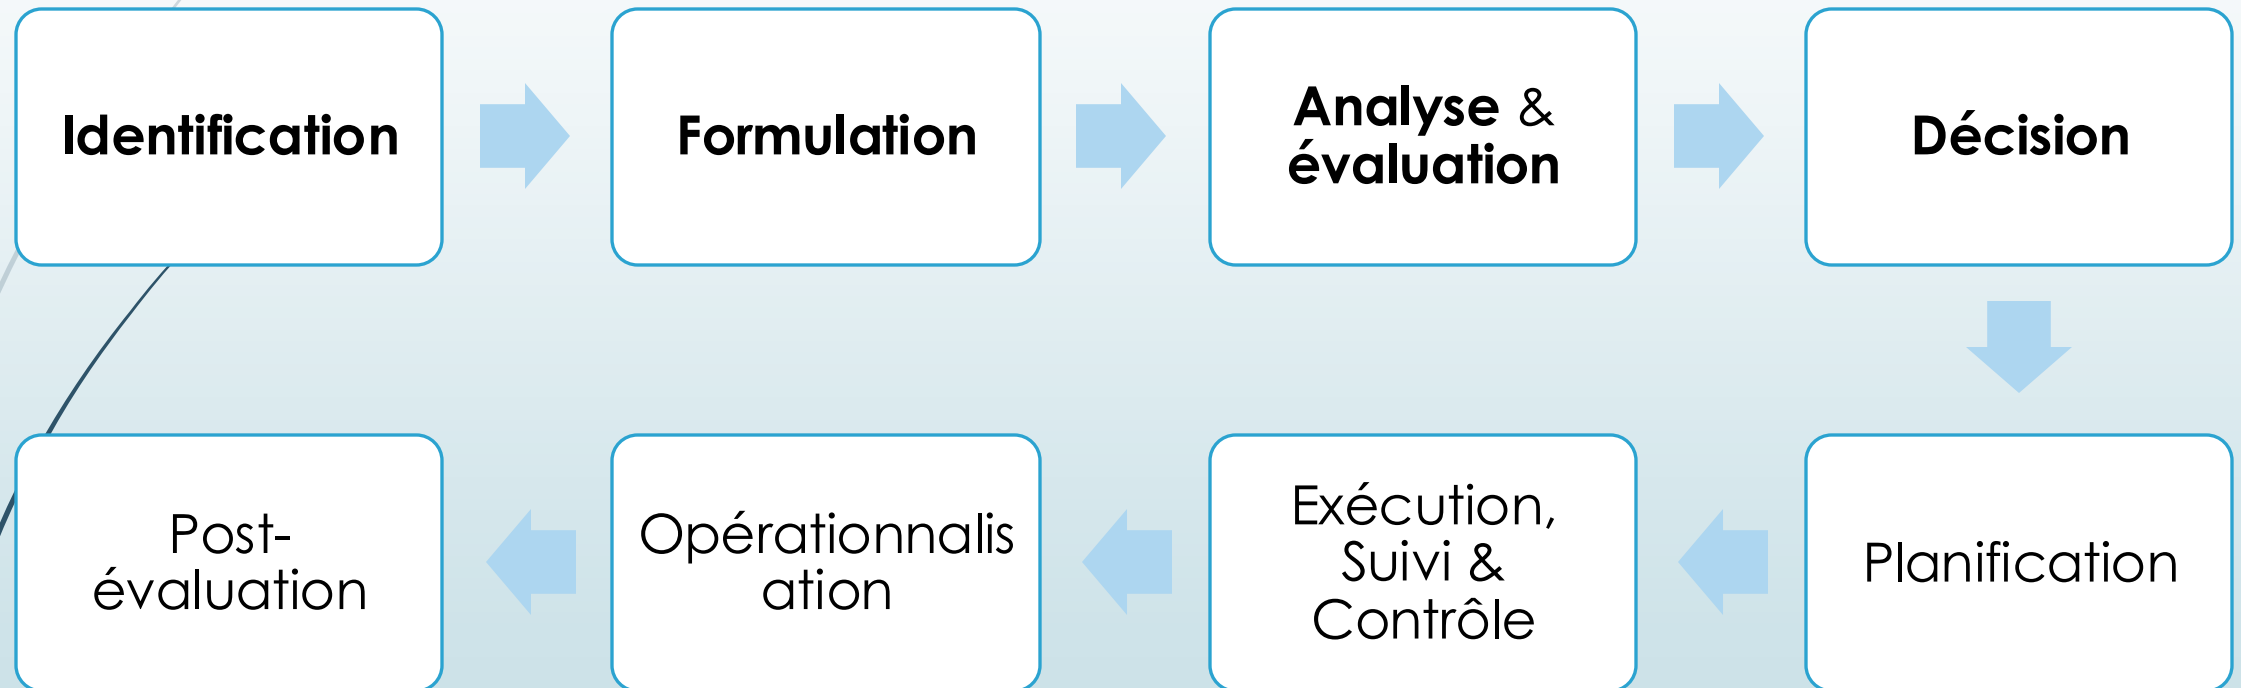

# La Planification

- Généralement pour planifier un projet, la première phase consiste à **le découper en plusieurs étapes** (identification de l'ensemble des tâches à réaliser), d'en **estimer la durée**, d'**identifier l'enchaînement des étapes** (ordonnancement des tâches), **affecter des ressources** (financières et humaines), et enfin **modéliser cette organisation sur un document opérationnel** partagé entre tous les acteurs concernés pour optimiser le déroulement et le suivi de la réalisation.

- Le planning constitué va permettre de réaliser **le suivi de projet** durant son déroulement. Il sera ainsi possible **de déterminer si les objectifs fixés sont atteints**, de suivre l'avancement au travers d'un tableau de bord de suivi de projet et enfin **de contrôler l'affectation des ressources** à la réalisation des différentes tâches.
- Une planification des tâches rigoureuse et réaliste sera donc le garant de l'avancement et de la réussite du projet.

# Les étapes de planification

1. Le découpage



2.  
L'ordonnancement



3. Le planning

# 1. Le découpage

- Ce qui doit être fait (tâches)
  - Par qui cela doit être fait (Ressources)
  - Comment les résultats (Livrables) doivent être présentés
  - Comment les valider (Jalons)
- 
- Une **TÂCHE** doit être précisée par un **VERBE** suivi d'un **NOM** (ex. Tester l'engin)
  - Un **JALON** doit être précisé par un **NOM** suivi d'un **PARTICIPE** (ex. Tests d'essais 1 et 2 effectués)



**Meilleure planification** : le découpage facilite l'estimation des durées à accorder à chaque opération

**Maîtrise du suivi** - la décomposition des livrables facilite le management global du projet

**Meilleure communication** : elle simplifie les échanges entre les parties prenantes du projet et fait gagner du temps à tous en offrant une vision exhaustive des différentes phases.

**Meilleure gestion des coûts** : l'allocation des moyens et leur suivi sont plus précis.

**Gestion des risques** : identification des zones critiques et mise en place de scénarios préventifs.

## Sources de données pour décrire les tâches, estimer leurs coûts et durées de réalisation

- Projets similaires assez récents
- Expérience du personnel spécialisé
- Consultants ou experts dans le domaine
- Devis techniques
- Bases de données spécialisées (ex. BTP)
- Enquêtes
- Presse spécialisée

## Conseil

Entrez dans les détails !

Les gens sous-estiment systématiquement le temps et les ressources nécessaires à l'exécution des tâches car ils ne savent simplement pas tout ce qu'ils ont à faire. Du coup, ils se retrouvent a posteriori avec des tâches beaucoup plus lourdes que ce qu'ils pensaient au départ et le projet perd un temps considérable.


## Exercice

- Faites le découpage de votre projet en faisant ressortir les tâches, les ressources, les livrables et les jalons.

# Organigramme des Tâches (aussi appelé Structure de Fractionnement des Tâches du projet (SFT) ou Work Breakdown Structure (WBS))

37


Principe : subdiviser le projet en **lots de tâches** d'une façon logique

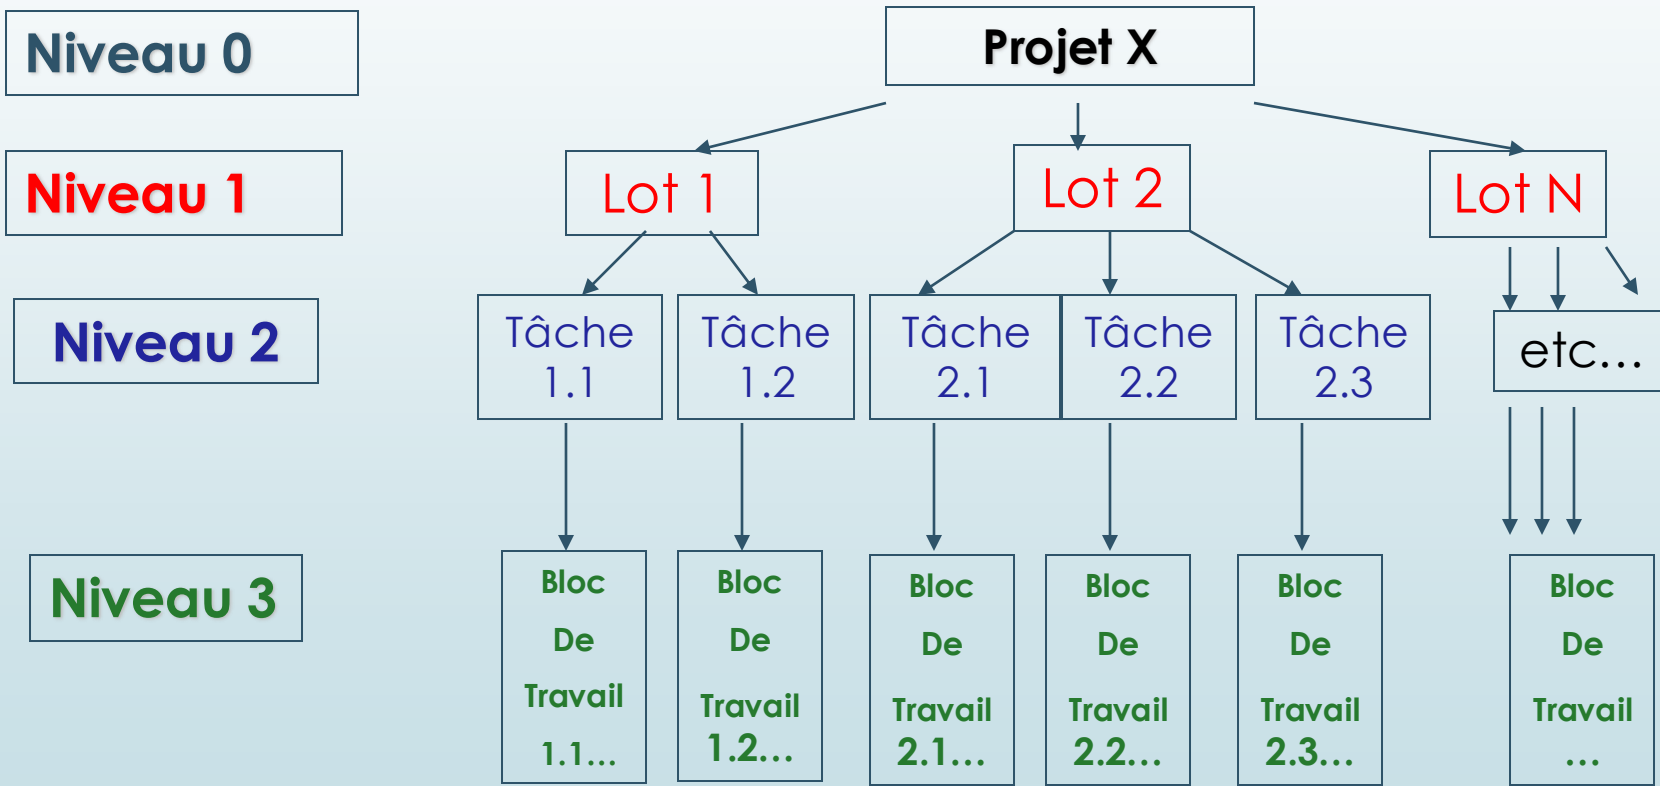


## 2. L'ordonnancement des tâches

- L'ordonnancement est l'élaboration d'un plan d'action permettant de déterminer les séquencements ou au contraire les parallélismes possibles entre l'exécution des tâches précédemment identifiées.


Lien *Fin-Début* (FD) : la tâche B ne peut débuter avant la fin de la tâche A  
Lien *Début-Début* (DD) : la tâche B ne peut débuter avant le début de la tâche A  
Lien *Fin-Fin* (FF) : la tâche B ne peut finir avant la fin de la tâche A  
Lien *Début-Fin* (DF) : La tâche B ne peut finir avant le début de la tâche A



**Lien Fin à Début (90% des cas)**  
B peut débuter quand A est terminé  
Ex: A= pose charpente, B= couverture

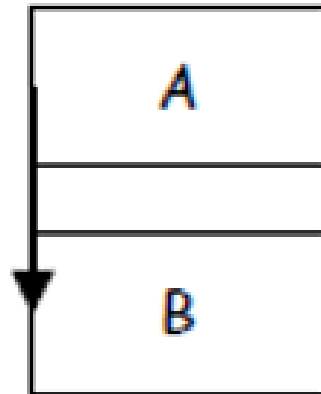


**Lien Début à Début (5% des cas)**  
B peut débuter quand A est commencé  
Ex: A= série d'interview, B= compte rendus

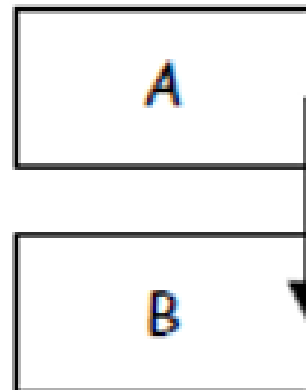


**Lien Fin à Fin (5% des cas)**  
B peut se terminer quand A est terminé  
Ex: A= négociation, B= préparation d'un contrat

- Un problème d'ordonnancement consiste à organiser dans le temps la réalisation de tâches, compte tenu de contraintes temporelles (délais, contraintes d'enchaînement) et de contraintes portant sur la disponibilité des ressources requises.

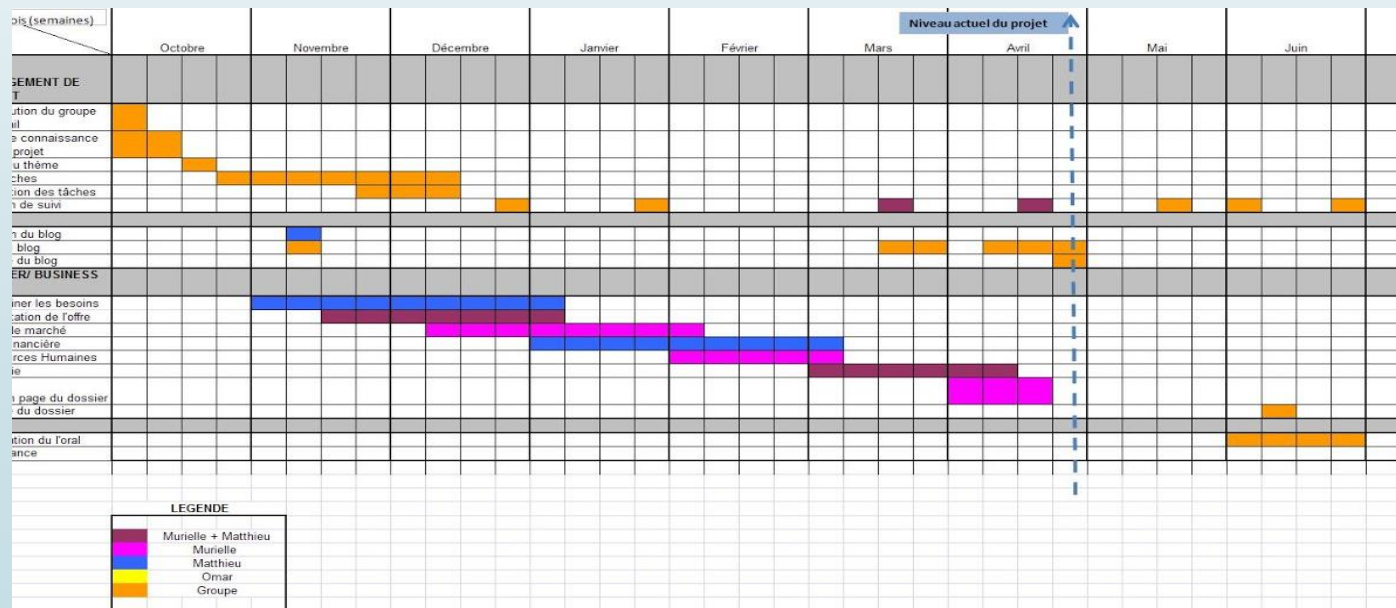



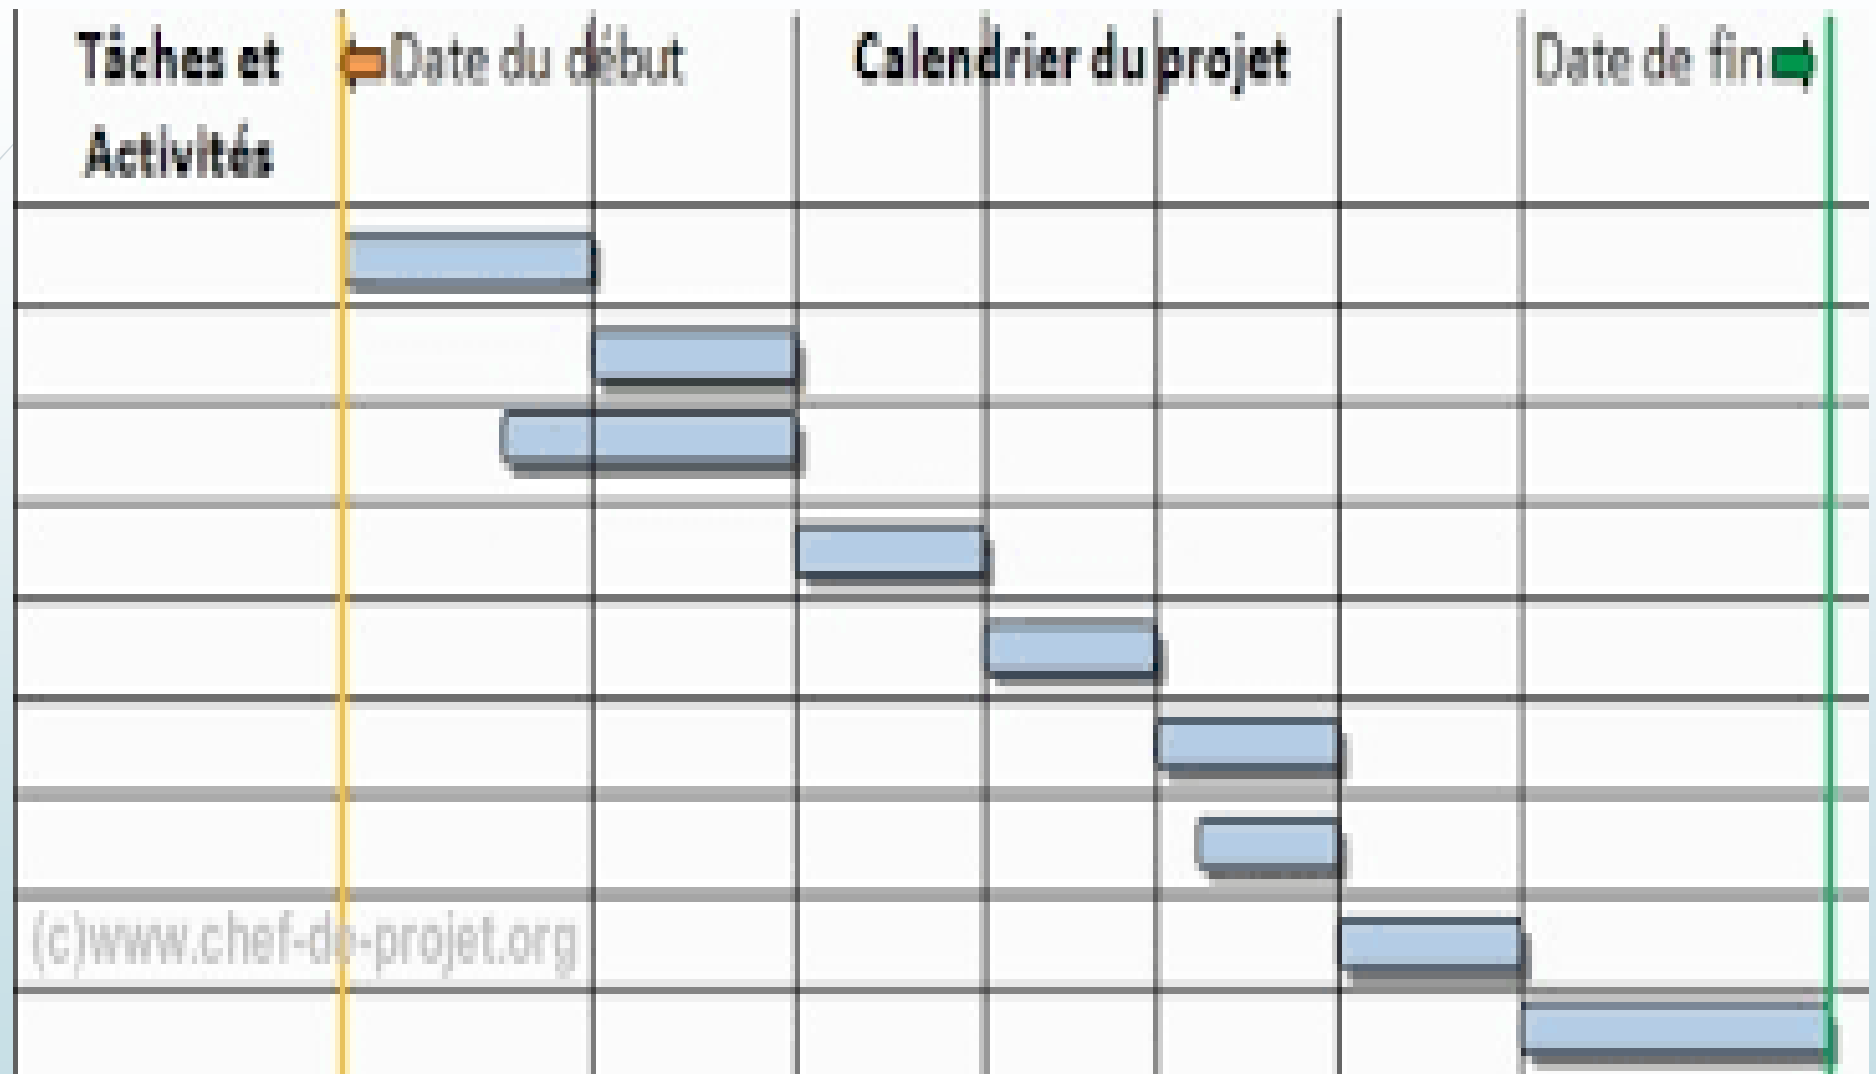

### 3. Le planning

Ordonnancement  
des tâches

Durée pour  
chaque tâche

Dates au plus tôt  
au plus tard

Identification des  
risques

# Gestion des risques

43

- Le *risque* est l'éventualité de ne pas fabriquer votre **produit**, respecter votre **calendrier** ou obtenir les **ressources** souhaitées en raison d'un événement imprévu ou à cause de l'absence d'un élément planifié.

Tous les projets présentent leur part de risque car il est impossible de prévoir l'avenir avec certitude. Cependant, l'importance du risque augmente :

- Avec la durée du projet ;
- Plus le délai séparant le démarrage, la préparation du projet et l'exécution des travaux est important ;
- Moins vous, votre organisation ou les membres de votre équipe avez d'expérience dans ce genre de projet ;
- Plus la technologie associée au projet est récente.

# Types de risques

## Risques positifs (opportunités)

- Profitent aux objectifs du projet (par exemple, vous permettre d'achever une tâche avec moins de personnel qu'escompté).

## Risques négatifs (menaces)

- Peuvent nuire à un ou plusieurs objectifs du projet (par exemple, vous empêcher de respecter un délai) ;

# Types de risques

## Risques propres à la gestion d'un projet

un objectif irréaliste, un manque de budget, délai trop court

## Risques juridiques

- non-respect du contrat, changement de l'environnement juridique

## Risques humains

- mauvaise communication, mauvaise répartition des tâches en fonction des compétences de chacun, fournisseur à risque, clients incertains, ...

## Risques techniques

- pas d'accès aux technologies requises, complexité du projet

# Gestion des risques

## 1. Identifiez les risques.

Recensez les aspects de votre plan ou de l'environnement de votre projet susceptibles de changer.

## 2. Évaluez les effets potentiels de ces risques sur votre projet.

Prenez en compte ce qu'il peut se passer si les choses ne se déroulent pas comme vous l'aviez prévu.

## 3. Montez des plans pour atténuer les effets des risques.

Choisissez un mode de protection de votre projet contre les conséquences des risques existant.

# Solutions

47

Plusieurs solutions s'offrent à vous :

- Vous pouvez accepter le risque. Vous estimez que celui-ci n'est pas assez grave, pas assez important pour modifier le projet ou que le risque qu'il survienne est faible.
- Modifier le projet dès le départ pour limiter le risque ou l'éviter complètement
- Construire un plan d'urgence pour les risques les plus forts. Le but est ici de trouver des solutions de remplacement sur les tâches et rôles concernés par le risque.
- Prendre une assurance... littéralement ou en tout cas certaines garanties !
- Limiter les risques au fur et à mesure en agissant en même temps que l'avancée du projet

## Exercice

- Quels sont les risques inhérents à votre projet collectif?



# Les livrables de la planification

## **Plan structurel** : répondre au QUOI

- Etablir la liste des travaux à accomplir

## **Plan organisationnel** : répondre au QUI

- Assigner les tâches et définir les responsabilités et les rôles de chaque intervenant dans le projet;

## **Plan opérationnel** : répondre au QUAND et au COMMENT

- calendrier d'exécution et stratégie de réalisation du projet

## **Budget** : répondre au COMBIEN

- coût du projet.

# Le budget

## Les coûts directs

- les coûts concernant des ressources exclusivement utilisées pour votre projet

## Les coûts indirects

- les coûts concernant des ressources allouées à plusieurs projets mais qui ne peuvent être imputées à un projet en particulier.

# Les coûts directs

- Salaires des membres de votre équipe de projet ;
- Éléments, fournitures et équipement utilisés pour votre projet ;
- Frais de déplacement pour réaliser les travaux dans le cadre de votre projet ;
- Contrats de sous-traitance concernant exclusivement votre projet.

# Les coûts indirects

| Les frais généraux                                                                                                                                                                                                                                                                           | Les frais de gestion                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Coûts de produits et services liés à votre projet qui sont difficiles à classer et à allouer directement.</p> <p>Il s'agit par exemple des avantages sociaux, de la location de locaux, de fournitures d'ordre général et des coûts du mobilier, des aménagements et des équipements.</p> | <p>Dépenses servant au fonctionnement de votre entreprise.</p> <p>Il s'agit par exemple des salaires du service juridique, du service financier et de la direction générale, ainsi que des honoraires correspondant à des prestations comptables et juridiques.</p> |

- Supposons que vous planifiez la conception et la création d'une brochure pour votre entreprise. Parmi les coûts directs figurent :
- **La main-d'œuvre** : c'est votre salaire et celui des autres membres de l'équipe de projet correspondant aux heures passées sur la brochure ;
- **Les matériaux** : le papier spécial utilisé pour la brochure ;
- **Les déplacements** : ce sont les coûts pour démarcher les sociétés susceptibles de concevoir la couverture de votre brochure ;
- **La sous-traitance** : elle regroupe les services de la société extérieure qui se charge de créer le dessin sur la couverture de la brochure.


- Voici des exemples de coûts indirects :
- **Les avantages sociaux** : assurance maladie, congés annuels, mutuelle, plan de retraite des employés, en dehors des salaires, pendant que vous et les autres membres de l'équipe travaillez sur la brochure ;
- **La location** : coût des locaux que vous utilisez pour développer la brochure ;
- **L'équipement** : ordinateur que vous utilisez pour composer la brochure ;
- **Les salaires de l'encadrement et des agents administratifs** : portion des salaires des cadres supérieurs et du personnel exécutant les tâches administratives nécessaires au fonctionnement de votre entreprise.

## Exercice

- Quels sont les coûts directs et indirects de votre projet collectif?

| Coûts directs | Coûts indirects |
|---------------|-----------------|
|               |                 |

# Phases de création du budget

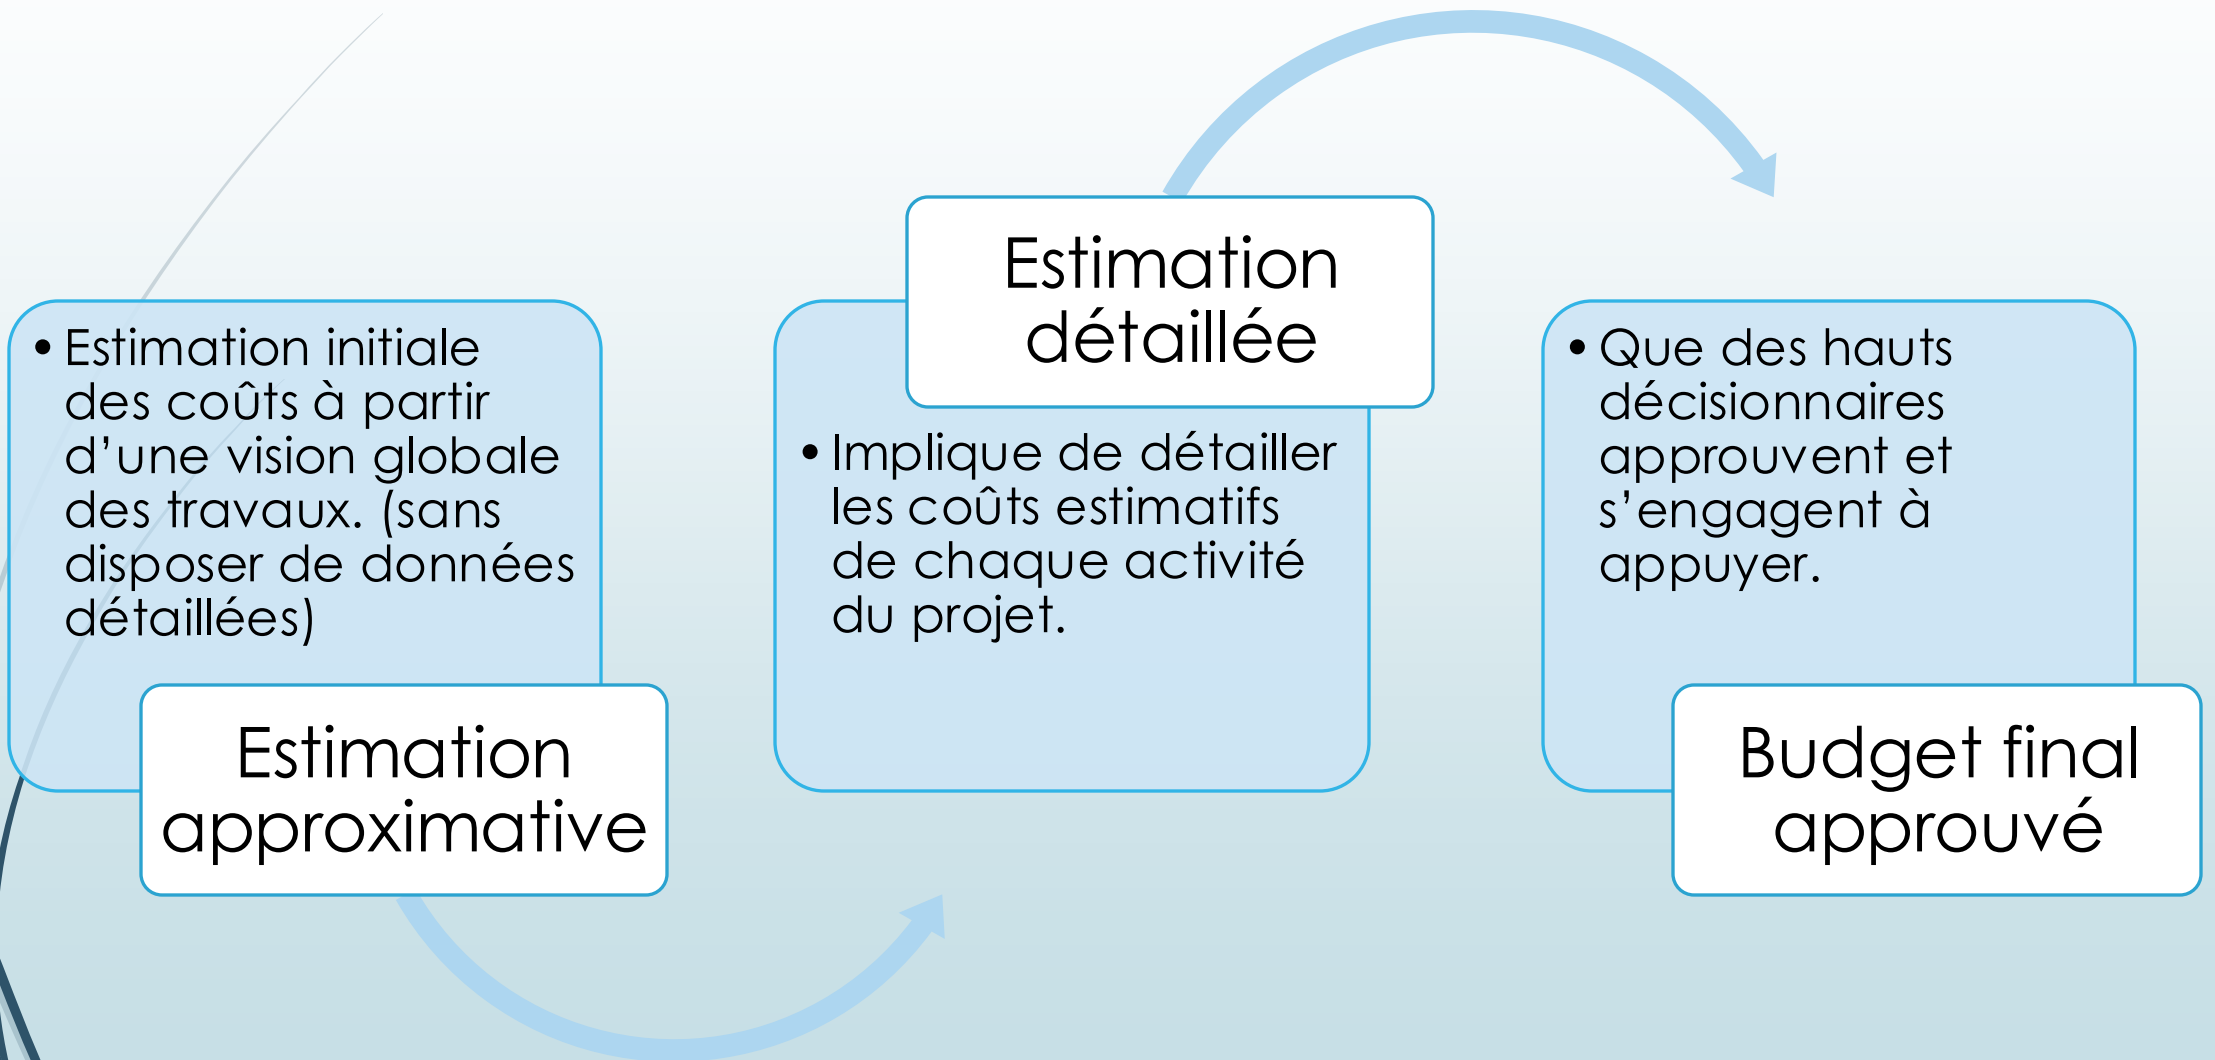



## Estimation approximative

- La phase d'estimation approximative génère une estimation initiale des coûts à partir d'une vision globale des travaux. Vous faites cette estimation sans disposer de données détaillées.
- Cette estimation traduit parfois ce qu'une personne **souhaite** dépenser et non ce que le projet va vraiment **coûter**. Vous ne détaillez généralement pas cette estimation jusqu'aux activités de dernier niveau.

# Estimation détaillée

## Estimation ascendante

- pour chaque lot de travaux du planning, effectuez une estimation de coût détaillée, puis additionnez chacune de ces estimations pour obtenir l'estimation du budget total du projet ;

## Estimation descendante

- Fixez un budget limite pour l'ensemble du projet, puis répartissez-le entre tous les composants de niveau 2, puis répartissez les différents budgets obtenus entre tous les composants de niveau 3.

# Attention

- **Prêtez bien attention aux éléments suivants, qui requièrent souvent des modifications du budget approuvé :**
- Les personnes assignées au projet sont plus ou moins expérimentées que prévu ;
- Les prix des biens et services que vous allez acheter ont augmenté ;
- Certaines ressources non humaines nécessaires ne sont plus disponibles au moment où vous en avez besoin ;
- Vos clients veulent des résultats différents ou supplémentaires par rapport à ceux prévus à l'origine.

# Exécution, suivi & contrôle

- vous devez garder en permanence à l'esprit trois données essentielles :
- **L'objectif du projet** : vous devez toujours avoir en tête l'objectif initial du projet, c'est sur son exécution que vous serez jugé en tant que chef de projet,
- **L'état actuel du projet** : vous devrez être capable à tout instant de dire où en est votre projet : est-il en retard ? en avance ? (c'est plus rare...),
- **Le chemin qui reste à parcourir** pour atteindre l'objectif.

Sachez, avant de vous attaquer à cette phase, que la problématique majeure à ce moment du projet est le décalage entre ce que vous aviez planifié initialement et ce qu'il va se passer, autrement dit, la réalité sera pleine de surprises !

# Le contrôle

61

## Reconfirmer le plan

- Activités qu'il a été convenu de réaliser ;
- Date de début et de fin de ces activités ;
- Charge de travail par personne

## Évaluer les performances

- Livrables intermédiaires et finaux;
- Date des jalons et début/fin activités ;
- Nombre d'heures pour chaque activité ;
- Quantité de ressources non humaines pour chaque activité ;
- Dépenses

## Mettre en place les mesures correctives

- si nécessaire, prenez des mesures pour remettre votre projet en conformité avec le plan initial ou, si cela s'avère impossible, modifiez le plan pour qu'il reflète les nouvelles attentes.

## Informar les gens

- révélez vos réussites, problèmes et mesures envisagées avec les parties prenantes de votre projet

## La fin du projet

- Quand peut on dire que le projet est terminé?
- **Réponse** : lorsqu'on a atteint le jalon de fin et qu'il n'y a plus rien à faire sur le projet.
- Lorsque TOUTES les tâches inscrites dans l'organigramme des tâches sont terminées

## Archivage du projet

- Regrouper les informations sur le projet pour gagner du temps lors de projets semblables

## Clôture du projet

- Opérations ayant pour but de mettre un point final aux relations contractuelles avec les parties prenantes

## Capitalisation

- Rapport de fin de projet (retour d'expérience, difficultés, risques ...)

# Retour d'expérience (REX / RETEX)

Recueil de  
l'information

Analyse et  
traitement

Diffusion de  
l'information

Mise en œuvre de  
l'expérience  
acquise sous forme  
de bonnes  
pratiques



# Retour d'expérience

Il concerne deux aspects distincts

- Le retour d'expérience fait sur **le produit ou l'ouvrage objet du projet** qui est la responsabilité des métiers ayant conçu et réalisé le produit ou l'ouvrage
- Le retour d'expérience fait sur **les méthodes, outils, pratiques de gestion du projet** employés durant le projet, c'est-à-dire son management.

« Dans toute chose, le labeur mène à l'expérience et l'expérience mène à l'excellence »

Daniel Desbiens

# Différence bilan fin de projet et retour d'expérience

| Bilan                                                                                                                                                                                                                        | REX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Il a pour objectif de renseigner la direction de l'entreprise et le client sur les résultats et leurs écarts par rapport à la prévision initiale.</p> <p>(points techniques, administratifs, commerciaux, financiers)</p> | <p>Il a pour objectif de</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Recueillir les améliorations apportées aux méthodes utilisées ou idées d'amélioration;</li><li>- Identifier les Difficultés et erreurs rencontrées</li><li>- Alimenter les bases de données (estimations heures d'études, montages, coûts)</li></ul> |
